


SITUAČNÍ VÝKRES PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

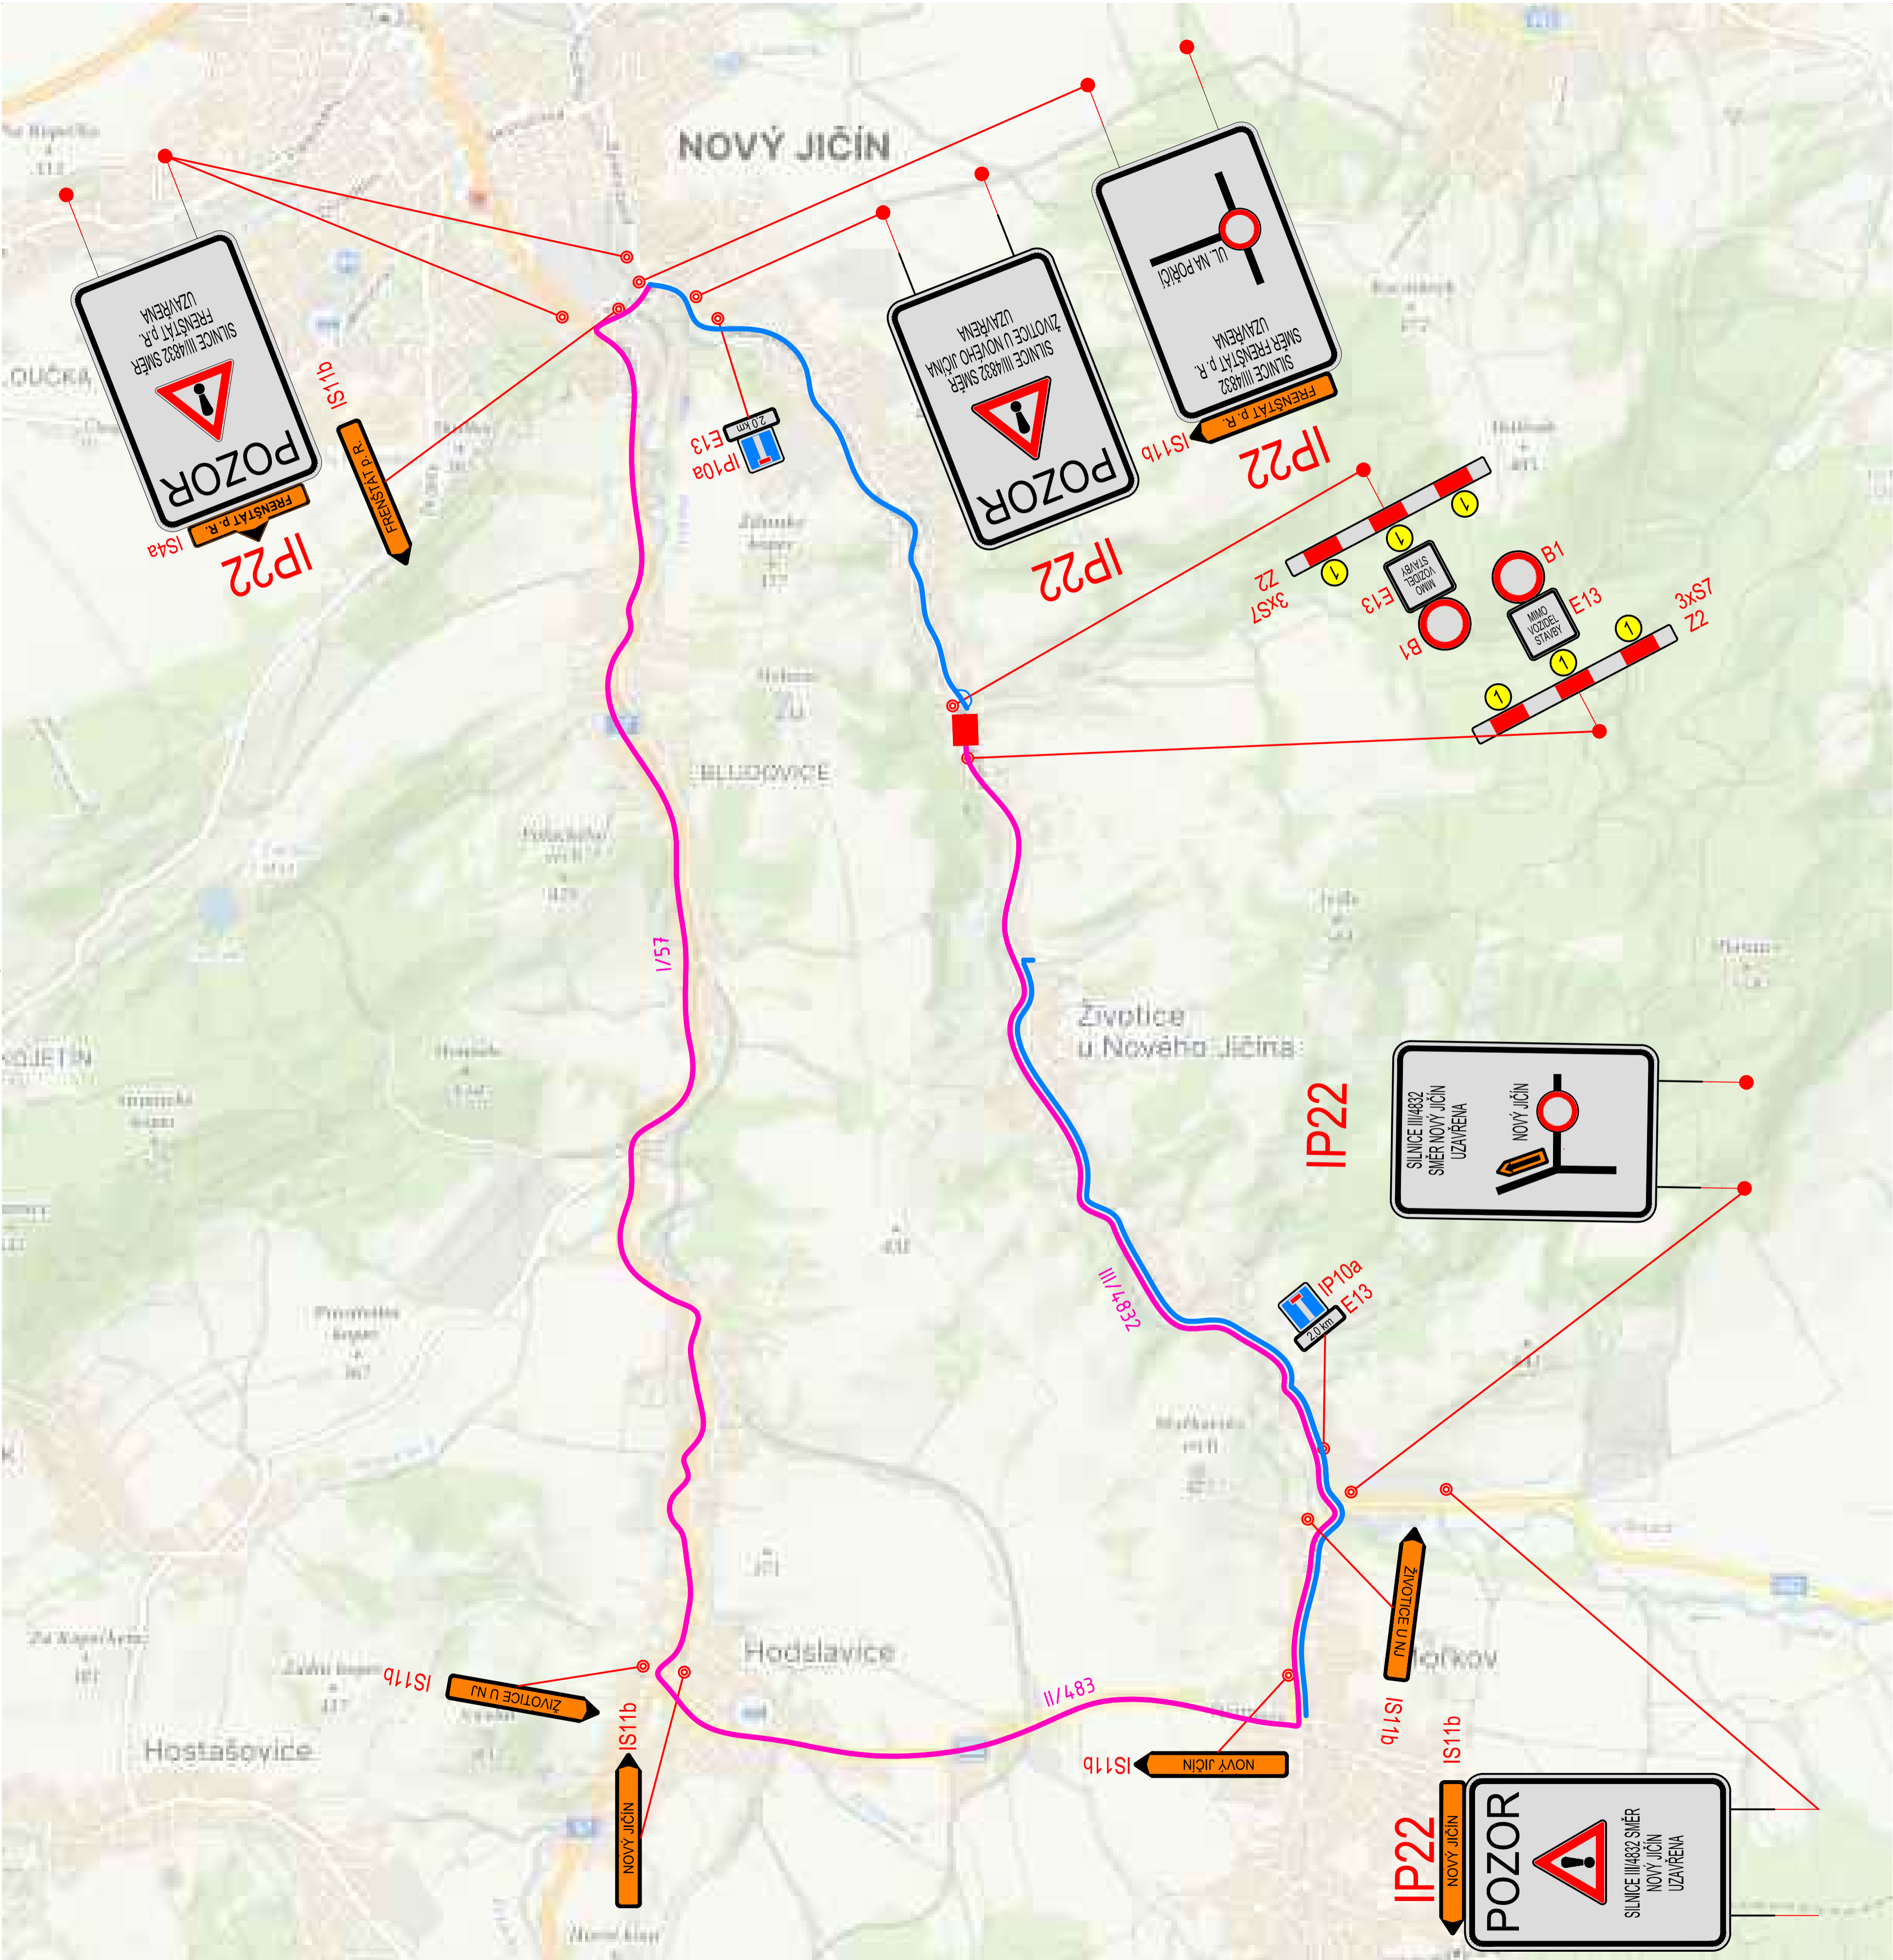

STAVBA: M704 - MOST NA PORČÍ U Č. P. 53 DOBA OMEZENÍ: cca 1 TÝDEN
UZAVŘENÝ ÚSEK SILNICE PRO VEŠKEROU DOPRAVU, MIMO VOZIDEL STAVBY, DÉLKA UZAVŘENÉHO ÚSEKU: 0,2km

OBJÍZDNÁ TRASA PRO VEŠKEROU DOPRAVU, DÉLKA OBJÍZDNÉ TRASY: 16,0km
PĚŠÍ DOPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI OBJEKTU SO 202 - PROVIZORNÍ LÁVKA

ZASTÁVKY PRO LINKOVÝ AUTOBUS ZŮSTANOU ZACHOVÁNY NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH
OBJÍZDNÁ TRASA BUDE ŘEŠENA SHODNĚ DLE NAVRŽENÉHO DZ. KYVADLOVOU DOPRAVOU.

Dotčené linky PAD:
882665 - Mořkov-Životice u Nového Jičína-Nový Jičín
882695 - Nový Jičín-Veřovice-Lichnov-Kopřivnice
882696 - Nový Jičín-Veřovice-Frenštát pod Radhoštěm
dopravcem výše uvedených linek je Transdev Morava s.r.o., provozní oblast: Novojičínsko Západ

883696 - Nový Jičín-Veřovice-Frenštát pod Radhoštěm
dopravcem výše uvedené linky je Z-Group bus a.s., provozní oblast: Novojičínsko Východ

Dotčené zastávky:
Nový Jičín,Žilina,kult.dům - obousměrně bez obsluhy výše uvedenými linkami
Nový Jičín,Žilina,u partyzána - obousměrně přemístěna na MK ul. Potoční, obsluha zajištěna NAD
Nový Jičín,Žilina,pož.zbroj - obsluha zajištěna NAD
Životice u Nového Jičína,u Jana - obsluha zajištěna NAD
Životice u Nového Jičína,obecní úřad - obsluha zajištěna NAD
Životice u Nového Jičína,kostel - obsluha zajištěna NAD
Mořkov,dolní konec - obsluha zajištěna NAD + linkami PAD
Mořkov,kostel - obsluha zajištěna NAD + linkami PAD + přestup mezi NAD a linkami PAD

NAD:
Náhradní autobusovou dopravu v délce 6km zajišť investor / stavba. Bude nahrazen každý spoj dotčených linek, přestup bude v zastávce Mořkov,kostel. Dopravci, kteří zajišťují dotčený úsek nemají menší autobus, než 12metrů. Požadavek na doplnění NAD je z důvodu požadavku na zajištění kapacity nejméně pro 15 cestujících, o délce vozidla ne větší než 6 metrů z důvodu otočení a zajištění vyloučeného úseku. Uzavírka bude naplánována na víkend.

IP22

POZOR

SILNICE III/4832
SMĚR FRENŠTÁT p. R.
UZAVŘENA

IP22

POZOR

SILNICE III/4832
SMĚR NOVÝ JIČÍN
UZAVŘENA

IP10a
2,0 km
E13

B1

MINI VOZIDEL
STAVBY

E13

3xS7
Z2

ŽIVOTICE U NJ IS11b

NOVÝ JIČÍN IS11b

FRENŠTÁT p. R. IS11b

IP22


SILNICE III/4832
SMĚR NOVÝ JIČÍN
UZAVŘENA

NOVÝ JIČÍN

IP22

SILNICE III/4832
SMĚR FRENŠTÁT p. R.
UZAVŘENA

UL. NA PORČÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT  MSS - PROJEKT		SÍDLO SPOLEČNOSTI: PRAHA 4, MELEČ, MELEČSKÁ 580/63 PSČ 14100 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ŽEROTINOVA 992, 755 01 VSETÍN IČ: 26849836 EMAIL: SEKRETARIAT@MSS-PROJEKT.CZ WWW.MSS-PROJEKT.CZ		INVESTOR Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. MARTIN MYNÁŘÍK		PROFESSE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. MARTIN MYNÁŘÍK			
VYPRACOVAL		ING. JAROSLAV LÍŠKA			
KONTROLOVAL		ING. MARTIN MYNÁŘÍK			
MÍSTO STAVBY		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Žilina u Nového Jičína			
NÁZEV STAVBY				STUPĚŇ	
M704 - MOST NA PORČÍ U Č. P. 53				DUSP/PPDS	
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI				DATUM	
C - SITUAČNÍ VÝKRESY				04/2024	
NÁZEV OBJEKTU				FORMÁT	
-				BxA4	
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU				MĚŘÍTKO	
-				-	
NÁZEV PŘÍLOHY				Č. ZAKÁZKY	
SITUAČNÍ VÝKRES PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ				-	
				ČÁST	OBJEKT
				C	-
				PÁŘE	
				Č.	Č. PŘÍLOHY
				-	C.04
